

### ACTA No 3

#### FORO FINALIZACIÓN AUDITORIA VISIBLES AL CONSORCIO OHS 2015

FECHA:	Agosto 02 de 2016
HORA INICIAL:	9:00 A.M.
HORA FINAL:	10:15 A.M.
LUGAR:	Biblioteca Departamental Salón multimedia 2.

OBJETIVO: Realizar Tercer Foro de Auditoria Visible de Finalización al contrato No 4145.0.26.1.749-2015 suscrito con el Contratista Consorcio OHS 2015.

#### ASISTENTES:

Doctor, Alexander Duran Peñafiel Secretario de Salud pública Municipal  
Ing. Diego Alejandro Orozco, Administrativo - SSPM  
Ing. Orlando Arbeláez Grupo Agua Potable - SSPM  
Ing. Alfonso Rojas Grupo Agua Potable - SSPM  
Abogado Juan Manuel Duque, Grupo ABOS, - SSPM  
Ing. Oswaldo Garrido Grupo Agua Potable - SSPM  
Ing. Iliana Rodríguez, Grupo Agua Potable - SSPM  
Ing. Álvaro Loaiza Grupo Agua Potable - SSPM  
Trabajadora Social Liliana Patricia Ortiz R. Grupo Agua Potable - SSPM  
Ing. Rodrigo Obonaga, Consorcio OHS 2015  
Ing. Héctor Vera, Consorcio OHS 2015  
Ing. José Otoniel Giraldo, Interventoría Universidad Del Valle  
Economista. Carla Fernanda Rojas, Interventoría Universidad Del Valle

INVITADOS: auditores visibles obras ejecutadas por el consorcio OHS 2015.

AUSENTE: No aplica

#### ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida y presentación de los objetivos de la auditoria Visible
2. Intervención del Secretario de Salud Pública Municipal
3. Intervención del Consorcio OHS 2015 a cargo de la Ing., Héctor Vera.
4. Intervención de la Interventoría de la Universidad del Valle a cargo del Ing. José Otoniel Giraldo.
5. Preguntas, inquietudes.


#### DESARROLLO:

1. La Trabajadora Social Liliana Patricia Ortiz R. del Grupo de Agua Potable de la SSPM, agradeció la presencia de los auditores visibles, presentó el orden del día, recordó a los asistentes la finalidad de las Auditorias Visibles y la importancia de esta estrategia de participación comunitaria tanto para el municipio de Cali como para la SSPM e informó que el objetivo del tercer Foro de auditorías Visibles era finalizar el contrato No 4145.0.26.1.749-2015, suscrito con el CONSORCIO OHS 2015 en cumplimiento del Decreto No. 411.0.20.0210 de 2010, modificado por el



Decreto 41.0.20.0189 de 2013 que estableció los mecanismos para la creación de grupos de Auditorías Visibles.

2. El doctor Alexander Duran Peñafiel, Secretario de Salud Pública Municipal dió un saludo de bienvenida, agradeció a los auditores visibles dado el sacrificio que implica su asistencia al tener que suspender sus labores diarias para el cumplimiento de esta invitación, resaltó la participación de los auditores visibles en el seguimiento de las obras, agradeció al Consorcio constructor de las obras por haber terminado la ejecución de las mismas, enfatizando en la necesidad de acometer estas obras con la mayor seriedad, idoneidad y profesionalismo, por tratarse de obras que impactan sobre la salud de las personas; para finalizar manifestó la importancia de continuar con el mejoramiento y cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento básico para la zona rural de Cali.

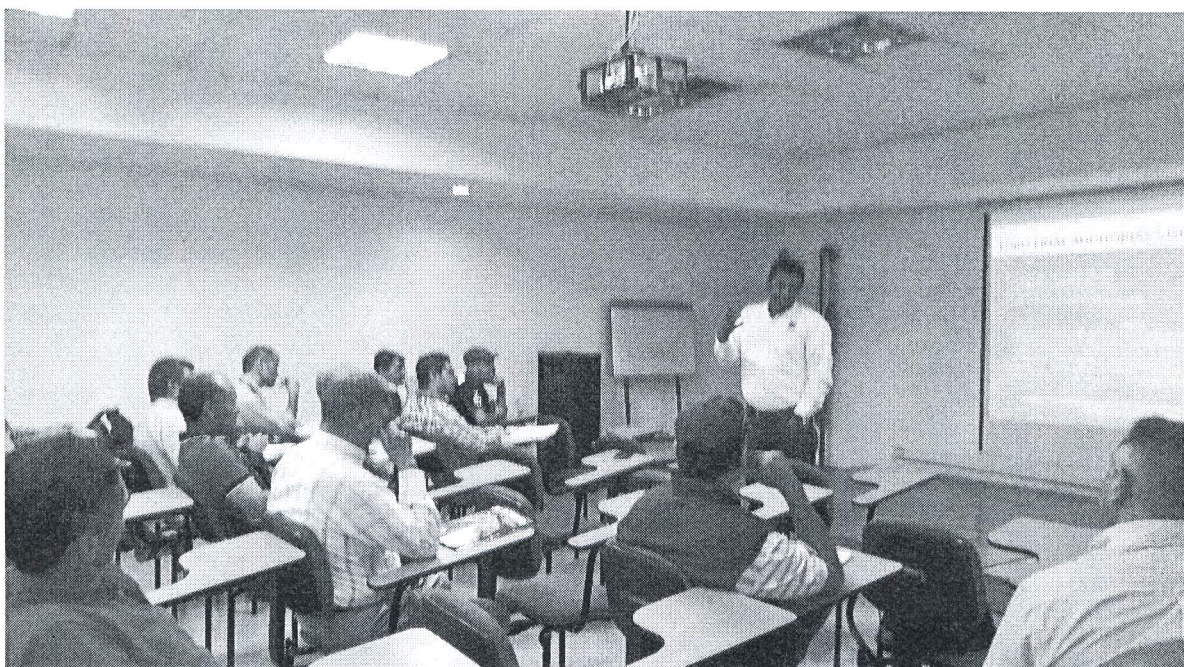


3. Seguidamente se dió la palabra al Consorcio contratista –CONSORCIO OHS-2015- quien a través del ingeniero Héctor Vera, hizo la exposición de las diferentes actividades llevadas a cabo en cada uno de los siete (07) frentes de trabajo: 1) Reposición alcantarillado sector El Edén Alto-La Sirena Corregimiento I Buitrera. 2) Mejoramiento PTARD Pueblo Nuevo Corregimiento la Buitrera. 3) Mejoramiento PTARD La Vorágine Corregimiento Pance, 4) Mejoramiento PTARD Pizamos-Corregimiento El Hormiguero, 5) Mejoramiento PTAP El Rosario-Corregimiento La Buitrera, 6) Mejoramiento acueducto Lomitas-Corregimiento La Paz, 7) Mejoramiento PTAP Las Palmas-Corregimiento La Castilla



4. se prosiguió con la presentación de la Interventoría de la obra llevada a cabo por la Universidad del Valle, quien a través del Ingeniero José Otoniel Giraldo expuso la parte del presupuesto, la inversión realizada, el cronograma de obra.

	TIPO DE INTERVENCION	CORREGIMIENTO	VR TOTAL
1	REPOSICION ALCANTARILLADO SECTOR EL EDEN	LA BUITRERA	\$ 183.957.070
2	MEJORAMIENTO PTARD SECTOR PUEBLO NUEVO	LA BUITRERA	\$ 102.727.798
3	MEJORAMIENTO PTARD SECTOR LA VORAGINE	PANCE	\$ 93.700.928
4	MEJORAMIENTO PTARD SECTOR DE PIZAMOS EL ROSARIO	EL HORMIGUERO	\$ 148.815.704
5	MEJORAMIENTO PTAP SECTOR EL ROSARIO	LA BUITRERA	\$ 307.191.606
6	MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LOMITAS	LA PAZ	\$ 104.842.881
7	MEJORAMIENTO PTAP LAS PALMAS	LA CASTILLA	\$ 48.088.638
VALOR TOTAL CONTRATADO			\$ 989.324.625



#### FORO FINAL AUDITORIA VISIBLE - CONSORSIO OHS

##### RESUMEN CRONOLOGICO DEL CONTRATO

INICIO DE OBRA = 15 JUNIO DE 2015

TERMINACION INICIAL OBRA = 31 DICIEMBRE DE 2015

PRORROGA EN TIEMPO = 15 DE FEBRERO DE 2016.

FECHA TERMINACION OBRA = 15 DE FEBRERO DE 2016 (OBSERVESE)

Comprométete con tu ciudad



5. Una vez terminadas las intervenciones por parte del Contratista y la Interventoría, se dio la palabra a los Auditores visibles, el Señor Lubín de la Sirena quien a nombre del señor Fabio Zuluaga solicitó atención de la socavación de la Berma de la vía adyacente a la tubería de alcantarillado recién instalada, motivo por el cual intervino el Ingeniero Álvaro Loaiza y la Ingeniera Iliana Rodríguez,



quienes le expusieron que este tema ya había sido tratado con el Sr. Fabio Zuluaga y se había hecho las diligencias ante la Secretaría de Infraestructura y Valorización ya que la Secretaría de Salud no tiene la competencia para esta labor.

Se dió la palabra al señor Jorge Rodríguez de la vereda Las Palmas, corregimiento La Castilla, quien dió los agradecimientos a la Secretaría de Salud por las labores realizadas en su vereda y por ultimo pidió la palabra al auditor visibles señor Edwar Rivera de la vereda Lomitas corregimiento La Paz para expresar de parte de su comunidad los agradecimientos a la Secretaría de Salud por tan valiosa colaboración en la ejecución de sus obras. Solicito al contratista realizar una visita técnica para la revisión de una válvula.

La señora Claudia Villamarín de la Buitrera agradeció al contratista su disponibilidad para atender todas las inquietudes sobre la obra, de igual forma a la secretaria de salud por la inversión realizada para su corregimiento, solicitó al contratista realizar una visita para la revisión de algunos aspectos técnicos de las obras.

Se acordó que el contratista y los ingenieros de la SSPM continuarían realizando visitas a los frentes de obra para revisión técnica. Se recordó que las obras cuentan con una póliza de cumplimiento que corresponde a una garantía que implica la obligación de amparar la estabilidad de la obra construida.

Por último se hizo entrega de un informe de las obras realizadas a cada uno de los auditores visibles.

Siendo las 10:15 a.m se dio por terminado el Foro de finalización de Auditoria Visible al contrato No 4145.0.26.1.749-2015 suscrito con el Contratista Consorcio OHS 2015.





Ing. Rodrigo Obonaga Gaitán  
Representante Legal Contratista Consorcio OHS 2015.

Se anexan las presentaciones.
