



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

CONTRATO OBRA

4145.0.26.1.756

**SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
“MEJORAMIENTO SISTEMAS DE ACUEDUCTO
Y POTABILIZACIÓN DE AGUA DE CONSUMO
ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI” Y “MEJORAMIENTO SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS AREA
RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI”**

AGOSTO DE 2016

INFORMACION DEL CONTRATO



CONTRATO:	4145.0.26.1.756-2015
CONTRATANTE:	Municipio de Santiago de Cali Secretaria de Salud Pública Municipal
CONTRATISTA:	Consorcio BGR 2015. R. L. Ing. Jhon Diego Rodríguez
Valor:	\$1.841.071.248,00
Fecha del Contrato:	28 de Mayo de 2015
Acta de Inicio:	30 de Junio de 2015
Plazo:	Seis (6) meses
Fecha de Terminación 1:	30 de Diciembre de 2015
Otro Si del Contrato No. 1:	Noventa (90) días
Fecha de Terminación No.2:	29 de Marzo de 2016
Otro Si del Contrato No. 2:	Setenta y Cuatro(74) días
Fecha de Terminación No. 3:	11 de Junio de 2016
Otro Si del Contrato No. 3:	Sesenta (60) días
Fecha de Terminación No. 4:	11 de Agosto de 2016

Comprométete con tu ciudad

DESCRIPCION DE PROYECTOS



GRUPO 3

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS	PPTO(\$)
1. ESTABILIZACIÓN TALUD ACUEDUCTO MONTEBELLO	\$ 150.188.572,00
2. CONSTRUCCIÓN TANQUE PTAP CAMPOALEGRE - MONTEBELLO	\$ 360.016.421,00
3. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO HORA CERO - VIA EL CRUCERO-TRES CRUCES - MONTEBELLO	\$ 215.157.095,00
4. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO CALLE LOS ESTUDIANTES CABECERA MONTEBELLO	\$ 215.516.779,00
5. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO CALLE 9 OESTE ENTRE AV. 44 OESTE Y LA YEE - MONTEBELLO	\$ 92.337.026,00
6. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO CALLE 47 OESTE CON AV.48 - MONTEBELLO	\$ 90.637.080,00
7. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO AV. 43 OESTE - MONTEBELLO	\$ 350.819.086,00
8. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SECTOR LAS PISCINAS CABECERA MONTEBELLO	\$ 41.347.736,00
9. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO QUINTA ETAPA CABECERA MONTEBELLO	\$ 325.051.453,00
	\$ 1.841.071.248,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Excavación y conformación de terrazas para la construcción de trinchos.
- Construcción de trinchos en Guadua y Esterilla.
- Excavación para la Construcción de Gaviones
- Excavación para la construcción de Canaleta.



P1. ESTABILIZACION TALUD ACUEDUCTO MONTEBELLO-CORREGIMIENTO MONTEBELLO



Antes



Después del avance

P2. CONSTRUCCION TANQUE PTAP CAMPOALEGRE –CORREGIMIENTO MONTEBELLO

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Excavación para la construcción de Tanque de Almacenamiento.
- Relleno con material Importado para la cimentación del Tanque.
- Amarre del acero refuerzo de zapata, losa de fondo y muros.
- Fundición solado de limpieza.
- Fundición losa de fondo.
- Inicio de fundición de muros.
- Suministro de accesorios, micromedidores y muretes.



ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Instalación de 456,15 ml de tubería Novafort de 8" para el Alcantarillado Principal y 400,80 ml de tubería Novafort de 6" para las Acometidas domiciliars, con sus respectivas sillars "Y".
- Se construyeron 9 cámaras de Alcantarillado tipo B.
- Se construyeron 70 cajas domiciliars.
- Se ha realizado la reconstrucción de 417,30 M2 de andenes y 197,6 ml de sardinel en concreto.
- Y demás obras adicionales y/o complementarias que han surgido en la ejecución del proyecto.



**P3. REPOSICION ALCANTARILLADO HORA CERO- VIA EL CRUCERO- TRES CRUCES CABECERA
CORREGIMIENTO MONTEBELLO**



Antes



Después

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Se realizo la excavación para la construcción de muro de contención en el sector de la Cruzada Cristiana.
- Se realizo la fundición de la zapata del muro de contención.
- Se inicio la fundición del muro de contención.



P4. REPOSICION ALCANTARILLADO CALLE DE LOS ESTUDIANTES CABECERA CORREGIMIENTO MONTEBELLO




ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Instalación de 607,13 ml de tubería Novafort de 8" para el Alcantarillado Principal y 354,98 ml de tubería Novafort de 6" para las Acometidas domiciliarias, con sus respectivas sillas "Y".
- Se construyeron 16 cámaras de Alcantarillado tipo B.
- Se construyeron 64 cajas domiciliarias.
- Se realizó la reposición de 1120,62 M2 de vía en asfalto y 16 M2 de vía en concreto.
- Se realizó la reconstrucción de 70,37 M2 de andenes en concreto.
- Y demás obras adicionales y/o complementarias que surgieron en la ejecución del proyecto.



P4. REPOSICION ALCANTARILLADO CALLE DE LOS ESTUDIANTES CABECERA CORREGIMIENTO MONTEBELLO

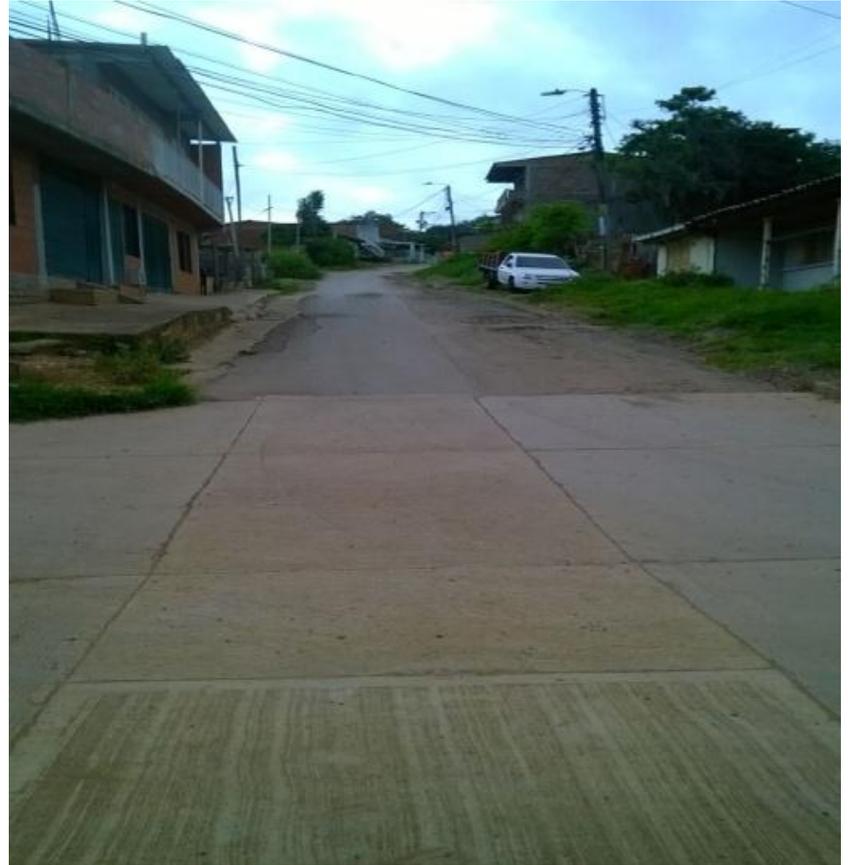

P5. REPOSICION ALCANTARILLADO CALLE 9 OESTE ENTRE AV. 44 OESTE y LA YEE MONTEBELLO



ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Instalación de 140,90 ml de tubería Novafort de 8" para el Alcantarillado Principal.
- Construcción de 3 cámaras de Alcantarillado tipo B
- Instalación de Acometidas Domiciliares



ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Instalación de 348,20 ml de tubería Novafort de 8" para el Alcantarillado Principal y 247,60 ml de tubería Novafort de 6" para las Acometidas domiciliarias, con sus respectivas sillas "Y".
- Se construyeron 10 cámaras de Alcantarillado tipo B. Se construyeron 42 cajas domiciliarias.
- Se realizó la reposición de 32,40 M2 de vía en asfalto.
- Se ha realizado la reposición de 49,60 M2 de andén en concreto.



P6. REPOSICION ALCANTARILLADO CALLE 47 OESTE CON AV. 48 - MONTEBELLO

REUNIONES CON LA COMUNIDAD PARA TRATAR EL TEMA DE LA REPOSICION DE LAS AREAS DE LA VIA, INTERVENIDAS PARA LA REPOSICION DEL ALCANTARILLADO.



15 DE ABRIL DE 2016



13 DE JUNIO DE 2016

“Este frente no se ha iniciado, debido a que la secretaria de infraestructura vial inicio el contrato de pavimentación del tramo comprendido entre la cruzada cristiana y guacas, lo que implica que la única vía que permite la movilidad de la gente de la comunidad de la parte alta de Montebello, es por la vía entre hora cero y los camperos, la cual corresponde a este tramo en el cual se debe ejecutar la reposición del alcantarillado”.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Instalación de 73,30 ml de tubería Novafort de 8" para el Alcantarillado Principal y 16,20 ml de tubería Novafort de 6" para las Acometidas domiciliarias, con sus respectivas sillas "Y".
- Se construyeron 2 cámaras de Alcantarillado tipo B.
- Se construyeron 19 cajas domiciliarias.
- Se realizó la reconstrucción de 88,86 M2 de andenes (Gradas) en concreto.



P8. REPOSICION ALCANTARILLADO SECTOR LAS PISCINAS CABECERA MONTEBELLO



Antes



Después

P9. REPOSICION ALCANTARILLADO SECTOR QUINTA ETAPA CABECERA MONTEBELLO

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Instalación de 541,20 ml de tubería Novafort de 8" para el Alcantarillado Principal y 438,82 ml de tubería Novafort de 6" para las Acometidas domiciliarias, con sus respectivas sillas "Y".
- Se construyeron 7 cámaras de Alcantarillado tipo B.
- Se construyeron 87 cajas domiciliarias.
- Se ha realizado la reposición de 297 M2 de vía en concreto y 362,57 de vía en asfalto y 375 ml de Sardinel.
- Se ha realizado la reconstrucción de 196,44 m2 de andén en concreto



P9. REPOSICION ALCANTARILLADO SECTOR QUINTA ETAPA CABECERA MONTEBELLO



Antes



Después

**Luego de la reposición del
alcantarillado se identifico
Pavimento artesal**

APORTES AL SECTOR



LA MAYORIA DEL PERSONAL HA SIDO
CONTRATADO EN MONTEBELLO Y
CAMPOALEGRE

PERSONAL EXTERNO CONTRATADO: 10

SE GENERARON APORTES INDIRECTOS A LA
ECONOMIA LOCAL: COMPRAS, ALQUILER DE
INMUEBLES., TRANSPORTES.



**! GRACIAS
POR SU
ASISTENCIA
Y ATENCION ;**
